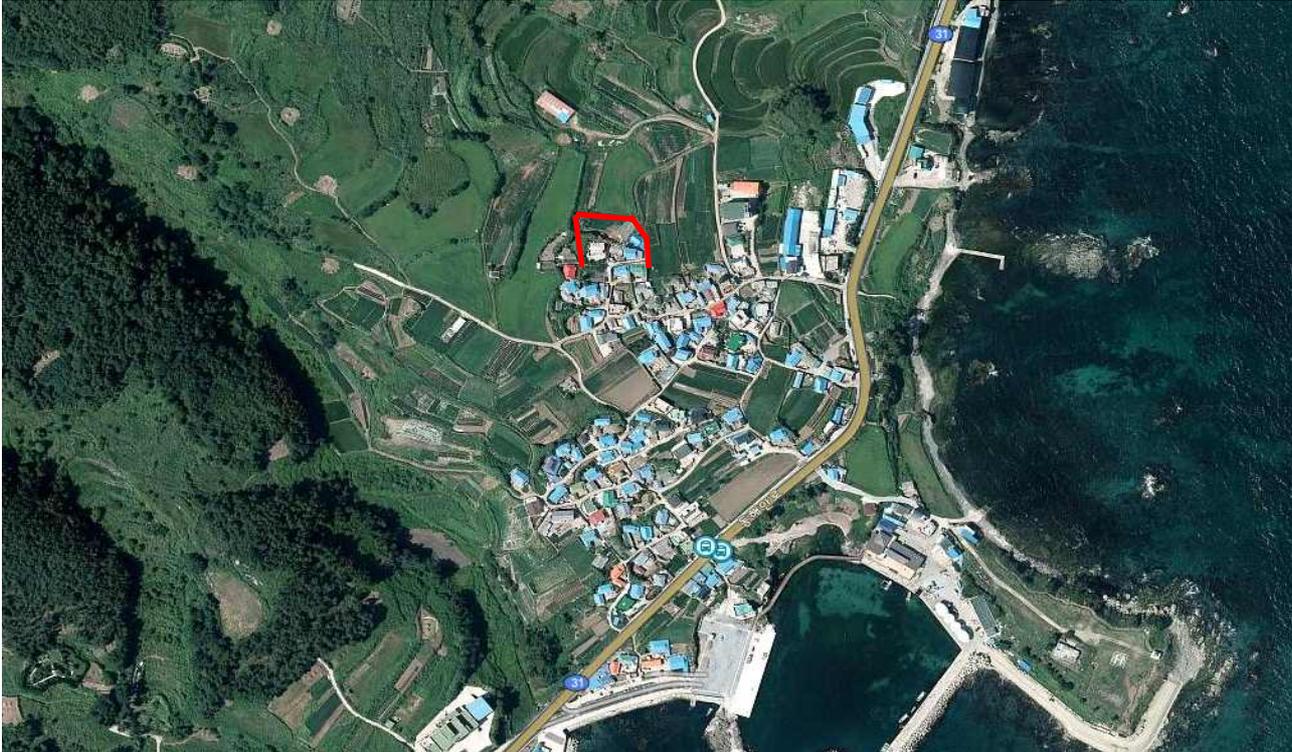


건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 16			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	구룡포 도구정지 관수로 개설공사
③ 사업위치	포항시 남구 구룡포 구평리 일원		
④ 사업개요	PE수도관 부설 및 접합(D150mm) L=909m		
⑤ 사업기간	2014.3.12. ~ 2014.6.9.	⑥ 시공회사 (감리회사)	혜성기업 대표 황성도
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 30 %, 당해연도 : 30 %		
⑧ 총 사업비 : 82.2백만원 (도급 : 58.6, 관급 : 23.6)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 17			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	구룡포 장길리 농로 포장공사
③ 사업위치	포항시 남구 구룡포 장길리 일원		
④ 사업개요	콘크리트포장(B=2.5m) L=127m, 옹벽블록설치(H=1.0m) L=82m		
⑤ 사업기간	2014.2.28.~2014.5.13.	⑥ 시공회사 (감리회사)	명제산업 대표 주지홍
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 40 %,		당해연도 : 40 %
⑧ 총 사업비 : 27.9백만원 (도급 : 15.1, 관급 : 12.8)			
⑨ 사업장 위치도			
			

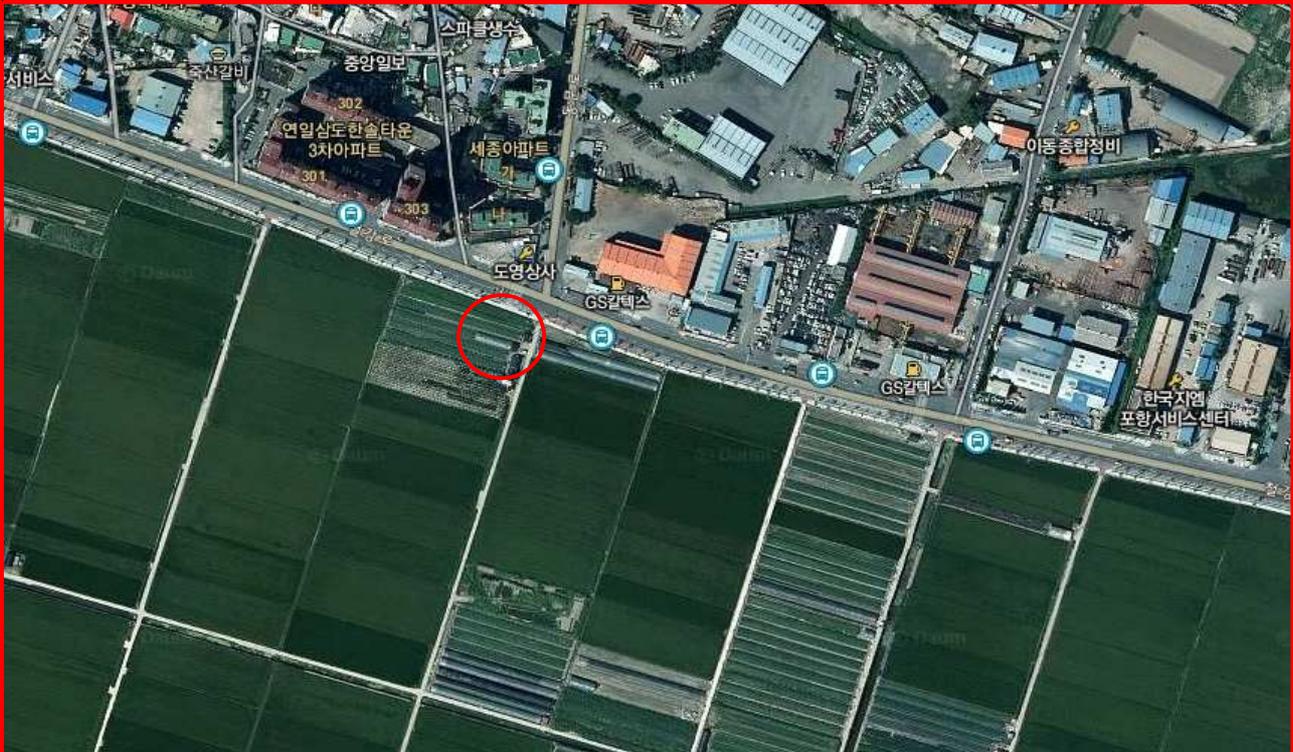
건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 19			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	연일 어미들 배수로 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 연일읍 어미들 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.5*0.5) L=644m		
⑤ 사업기간	2014.3.13.~2014.5.26.	⑥ 시공회사 (감리회사)	대경건설 대표 정성인
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 30 %,		당해연도 : 30 %
⑧ 총 사업비 : 66백만원 (도급 : 31.4, 관급 : 34.6)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 20			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	연일 인주리 용배수로 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 연일읍 인주리 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.6*0.6) L=420m		
⑤ 사업기간	2014.3.12. ~ 2014.5.25.	⑥ 시공회사 (감리회사)	선남건설 대표 방승제
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 30 %,		당해연도 : 30 %
⑧ 총 사업비 : 46.9백만원 (도급 : 20.2, 관급 : 26.7)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 21			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	연일 어미들 암반관정 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 연일읍 동문리 일원		
④ 사업개요	펌프(7.5HP) 설치, 연암확공 H=110m		
⑤ 사업기간	2014.2.24. ~ 2014.5.24.	⑥ 시공회사 (감리회사)	평화지질 대표 오영운
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 80 %,		당해연도 : 80 %
⑧ 총 사업비 : 61.2백만원 (도급 : 61.2, 관급 : 0)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 23			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	오천 세계1리 농로 및 용배수로 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 오천읍 세계리 일원		
④ 사업개요	식생블럭설치(H=0.9~2.4m) L=173.5m, 콘크리트포장(B=3) L=172m		
⑤ 사업기간	2014.2.28.~2014.5.28.	⑥ 시공회사 (감리회사)	에스엠건설 대표 진상문
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 20 %,		당해연도 : 20 %
⑧ 총 사업비 : 65.3백만원 (도급 : 30, 관급 : 35.3)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 24			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	오천 문덕2리 용배수로 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 오천읍 문덕2리 일원		
④ 사업개요	U형개거(1.2*1.0) L=108m		
⑤ 사업기간	2014.3.3. ~ 2014.5.16.	⑥ 시공회사 (감리회사)	두양EMI 대표 이수근
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 30 % ,		당해연도 : 30 %
⑧ 총 사업비 : 28.8백만원 (도급 : 10.7, 관급 : 18.1)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 25			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	오천 문충2리 용배수로 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 오천읍 문충2리 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.5*0.5) L=220m		
⑤ 사업기간	2014.3.3. ~ 2014.3.31.	⑥ 시공회사 (감리회사)	태백건설 대표 안진경
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 80 %,		당해연도 : 80 %
⑧ 총 사업비 : 19.4백만원 (도급 : 9.6, 관급 : 9.8)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 28			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	대송 장동3리 갯골 용배수로 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 대송면 장동3리 일원		
④ 사업개요	U형개거(2.0*1.5) L=100m		
⑤ 사업기간	2014.2.24. ~ 2014.5.9.	⑥ 시공회사 (감리회사)	유정건설 대표 박준만
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공검사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 40 %,		당해연도 : 40 %
⑧ 총 사업비 : 63.2백만원 (도급 : 44.3, 관급 : 18.9)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 29			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	대송 대각양수장 관로 보수공사
③ 사업위치	포항시 남구 대송면 대각리 일원		
④ 사업개요	PVC파이프 철거후 접합(D150mm) L=720m		
⑤ 사업기간	2014.2.26.~2014.5.11.	⑥ 시공회사 (감리회사)	문화수도공업사 대표 신종수
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %, 당해연도 : 10 %		
⑧ 총 사업비 : 26.2백만원 (도급 : 26.2)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 31			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	동해 마산리 농로 포장공사
③ 사업위치	포항시 남구 동해면 마산리 일원		
④ 사업개요	콘크리트포장(B=2.5m) L=106m		
⑤ 사업기간	2014.3.3.~2014.5.16.	⑥ 시공회사 (감리회사)	기인건설 대표 차환기
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 20 %,		당해연도 : 20 %
⑧ 총 사업비 : 18.2백만원 (도급 : 13.1, 관급 : 5.1)			
⑨ 사업장 위치도			

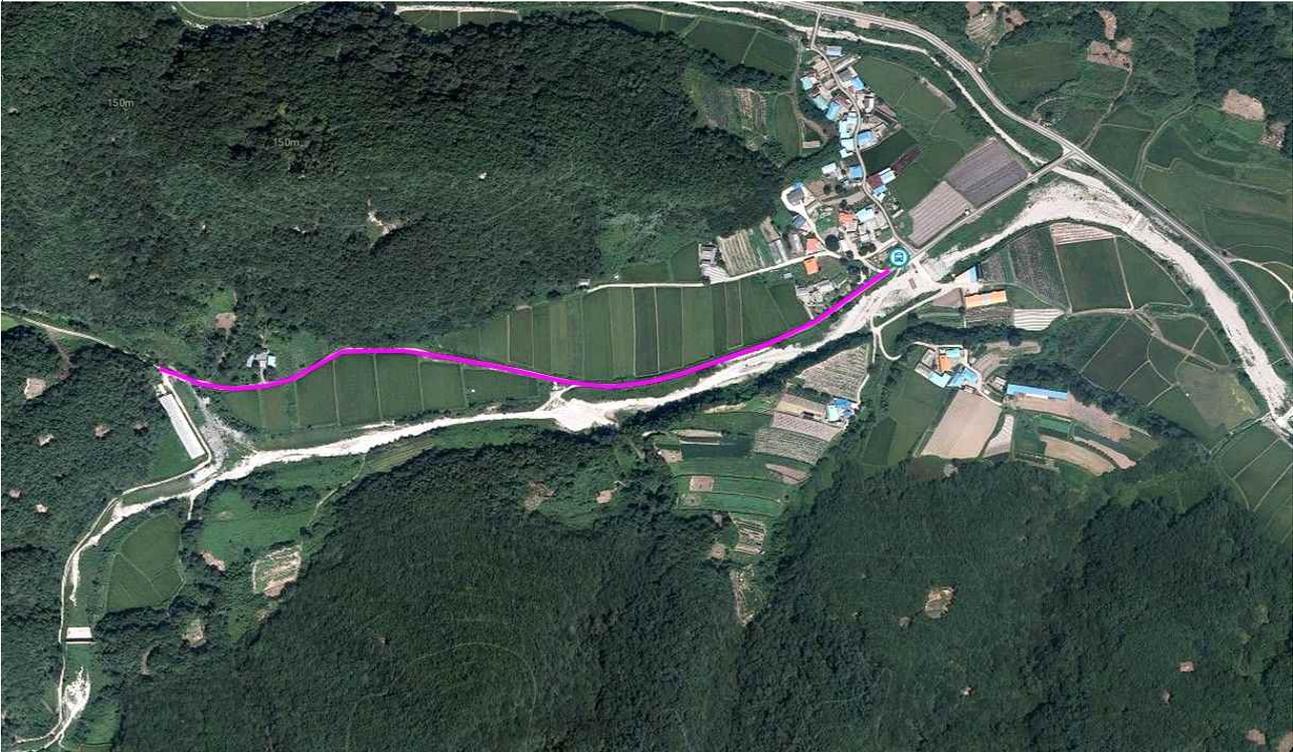
건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 32			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	동해 상정2리 거무골 농로 포장공사
③ 사업위치	포항시 남구 동해면 상정2리 일원		
④ 사업개요	콘크리트포장(B=2.5m) L=53.7m, 중력식옹벽(H=2.5m) L=19m 교량보수(B=4m, L=6.3m) 1개소		
⑤ 사업기간	2014.2.28.~2014.5.13.	⑥ 시공회사 (감리회사)	경토건설 대표 이동대
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공검사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 50 %,		당해연도 : 50 %
⑧ 총 사업비 : 41백만원 (도급 : 26.2, 관급 : 14.8)			
⑨ 사업장 위치도			

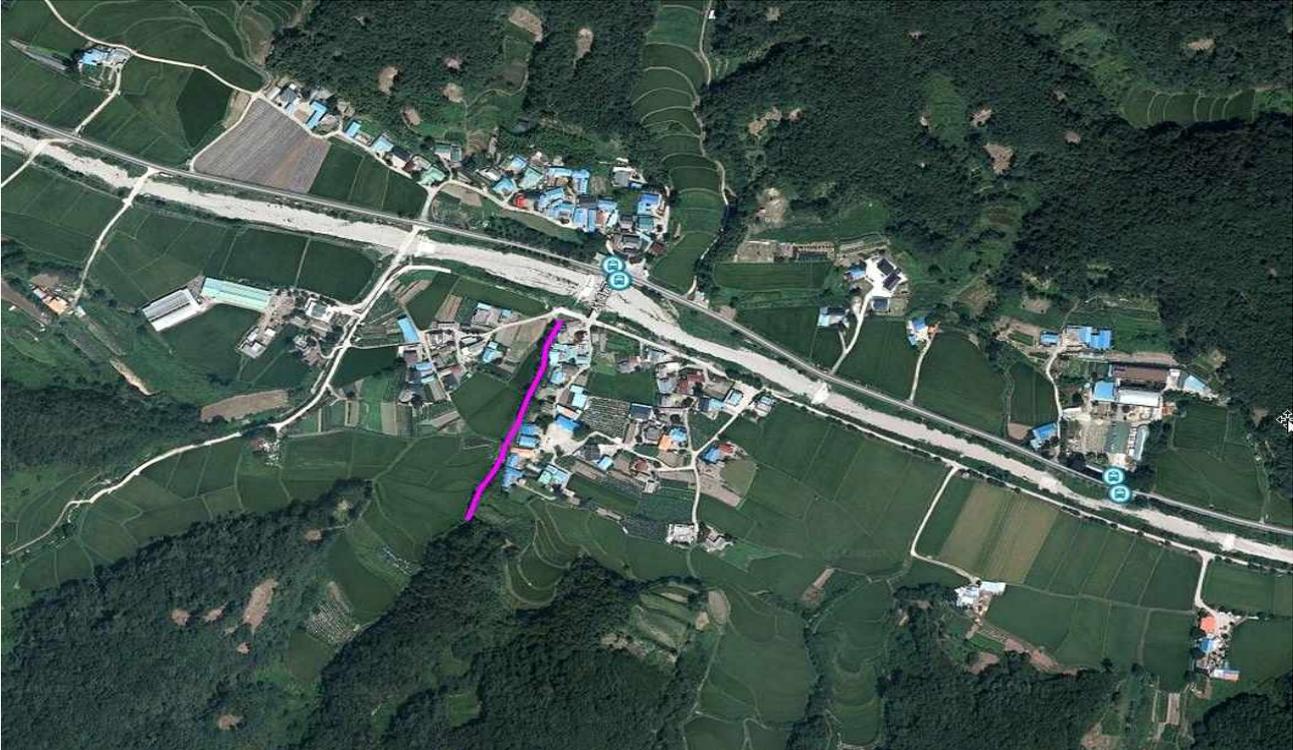
건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 33			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	동해 금광1리 용배수로 및 금광지 집수구 수문설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 동해면 금광1리 일원		
④ 사업개요	U형개거(1.5*1.0) L=60m		
⑤ 사업기간	2014.2.21. ~ 2014.5.6.	⑥ 시공회사 (감리회사)	대운건설 대표 최광석
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 40 %,	당해연도 : 40 %	
⑧ 총 사업비 : 36.5백만원 (도급 : 27, 관급 : 9.5)			
⑨ 사업장 위치도			

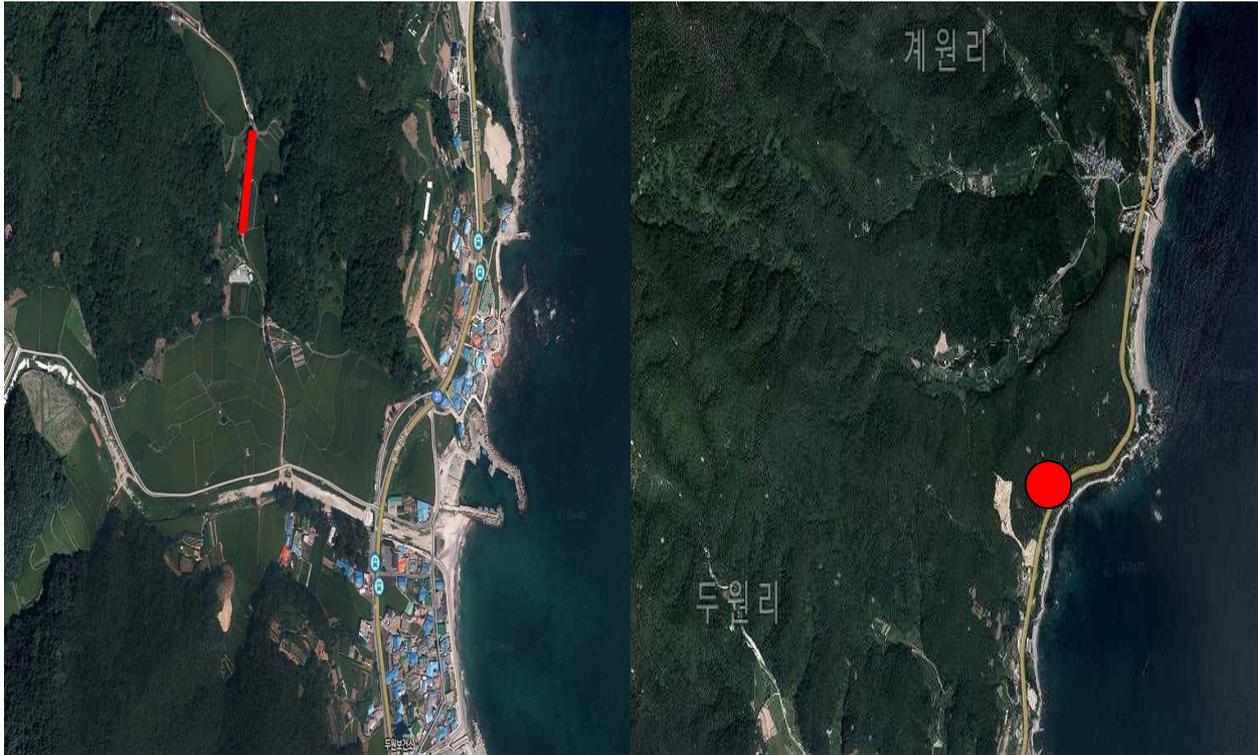
건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 34			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	장기 산서리 농로 포장공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기 산서리 일원		
④ 사업개요	콘크리트포장(B=3.5~4.0m) L=517m		
⑤ 사업기간	2014.2.21. ~ 2014.5.6.	⑥ 시공회사 (감리회사)	태은건설 대표 권태은
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %,		당해연도 : 100 %
⑧ 총 사업비 : 61.9백만원 (도급 : 21.4, 관급 : 40.5)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 35			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	장기 산서리 용배수로 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 산서리 일원		
④ 사업개요	U형개거(1.2*1.0) L=125m		
⑤ 사업기간	2014.2.24. ~ 2014.5.9.	⑥ 시공회사 (감리회사)	성우건설 대표 허호대
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 80 %, 당해연도 : 80 %		
⑧ 총 사업비 : 54.8백만원 (도급 : 36.5, 관급 : 15, 폐기물 : 3.3)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 36			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	장기 두원리 농로 및 수로 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 두원리 일원		
④ 사업개요	식생옹벽블럭 L=166m, A=304.7m ² , 계비옹벽 L=20m 콘크리트포장(B=3m) L=120m		
⑤ 사업기간	2014.3.11. ~ 2014.6.8.	⑥ 시공회사 (감리회사)	대경건설 대표 정성인
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 20 %,		당해연도 : 20 %
⑧ 총 사업비 : 74백만원 (도급 : 40.9, 관급 : 33.1)			
⑨ 사업장 위치도			
			

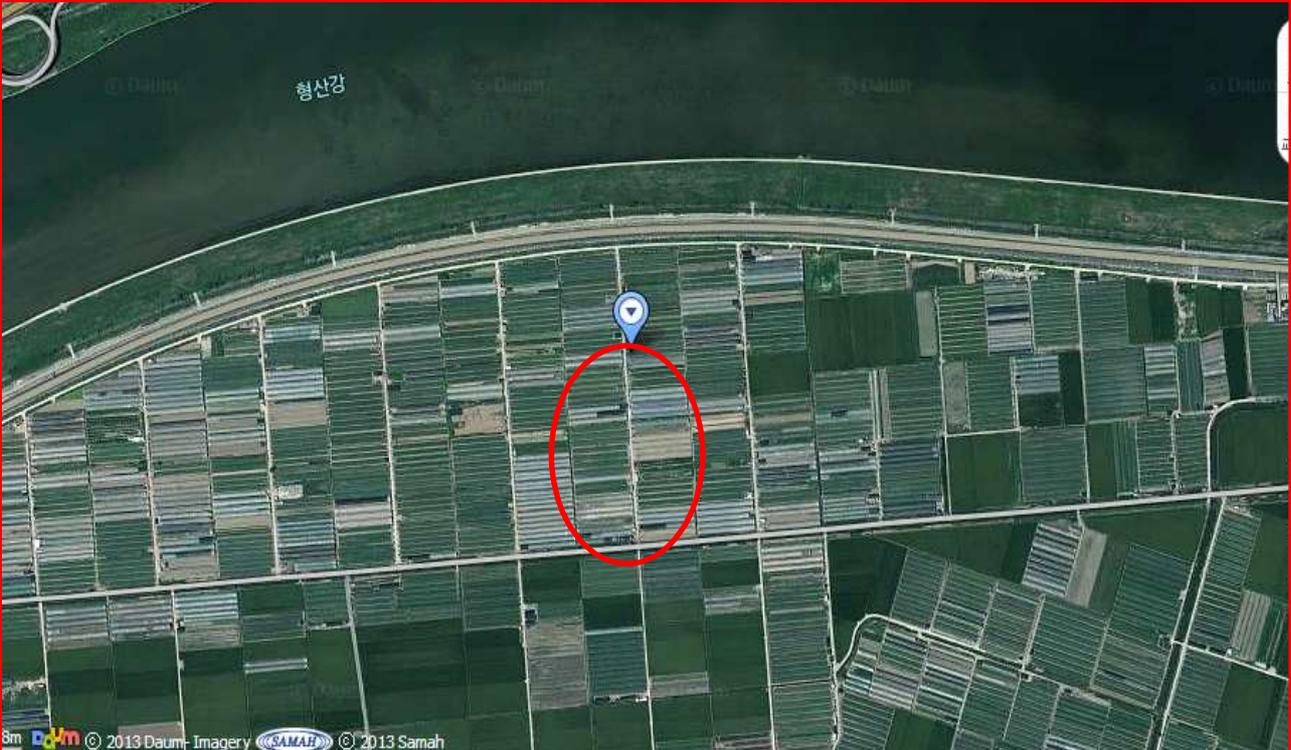
건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 37			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	호미곶 대보2리 용배수로 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 호미곶면 대보2리 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.6*0.6) L=281.6m		
⑤ 사업기간	2014.2.28.~2014.5.13.	⑥ 시공회사 (감리회사)	대경건설 대표 정성인
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 80 %, 당해연도 : 80 %		
⑧ 총 사업비 : 54.1백만원 (도급 : 40.2, 관급 : 13.9)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 43			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	대승 남성1리 성좌지 개보수공사
③ 사업위치	포항시 남구 대승면 남성1리 일원		
④ 사업개요	제당보강 L=89m, 배수관(D=600mm) L=191m, 식생블록(H=1.5~2.0m) L=61		
⑤ 사업기간	2014.3.6.~2014.6.3.	⑥ 시공회사 (감리회사)	포항수도공업사 대표 신수원
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 20 %,	당해연도 : 20 %	
⑧ 총 사업비 : 69.9백만원 (도급 : 33.1, 관급 : 35.5, 폐기물 : 1.3)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 44			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	연일 청심들 배수로 설치공사(명시이월)
③ 사업위치	포항시 남구 연일읍 청심들 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.4*0.4) L=276m		
⑤ 사업기간	2014.2.26.~2014.5.11.	⑥ 시공회사 (감리회사)	덕우건설 대표 정호태
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 시설6급 성명 : 이상욱
⑦ 공 정 율	전체 : 100 %,		당해연도 : 100 %
⑧ 총 사업비 : 28.1백만원 (도급 : 13.4, 관급 : 14.7)			
⑨ 사업장 위치도			
			

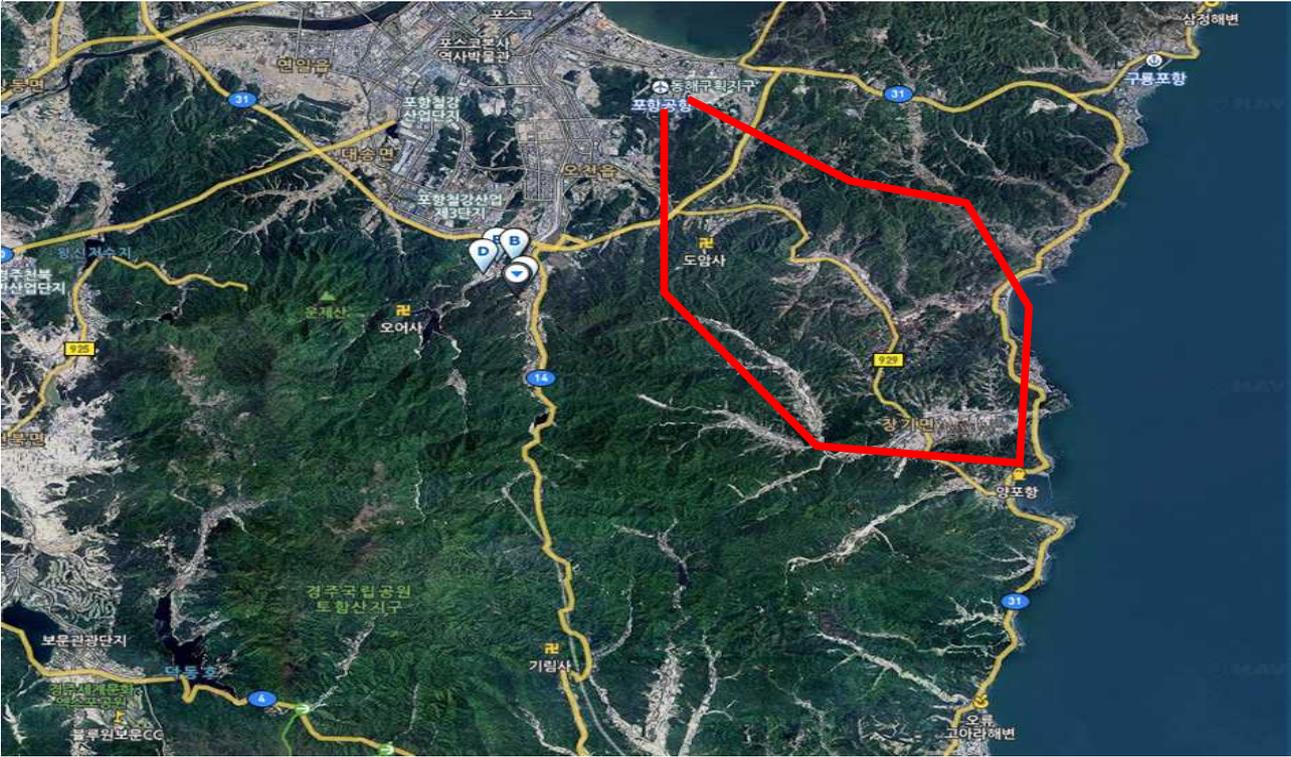
건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 45			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	연일 자명2리 농수로 설치공사(명시이월)
③ 사업위치	포항시 남구 연일읍 자명2리 일원		
④ 사업개요	U형개거(1.0*1.0) L=80m		
⑤ 사업기간	2014.3.3. ~ 2014.5.16.	⑥ 시공회사 (감리회사)	용도건설 대표 김성권
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 90 %,		당해연도 : 90 %
⑧ 총 사업비 : 27.3백만원 (도급 : 19.3, 관급 : 8)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 47			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	동해 입암2리 용배수로 개설 및 농로정비공사(명시이월)
③ 사업위치	포항시 남구 동해면 입암2리 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.4*0.4) L=170.5m		
⑤ 사업기간	2014.2.24. ~ 2014.5.9.	⑥ 시공회사 (감리회사)	한동산업개발 대표 천기화
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 80 %,		당해연도 : 80 %
⑧ 총 사업비 : 40.7백만원 (도급 : 27.4, 관급 : 13.3)			
⑨ 사업장 위치도			

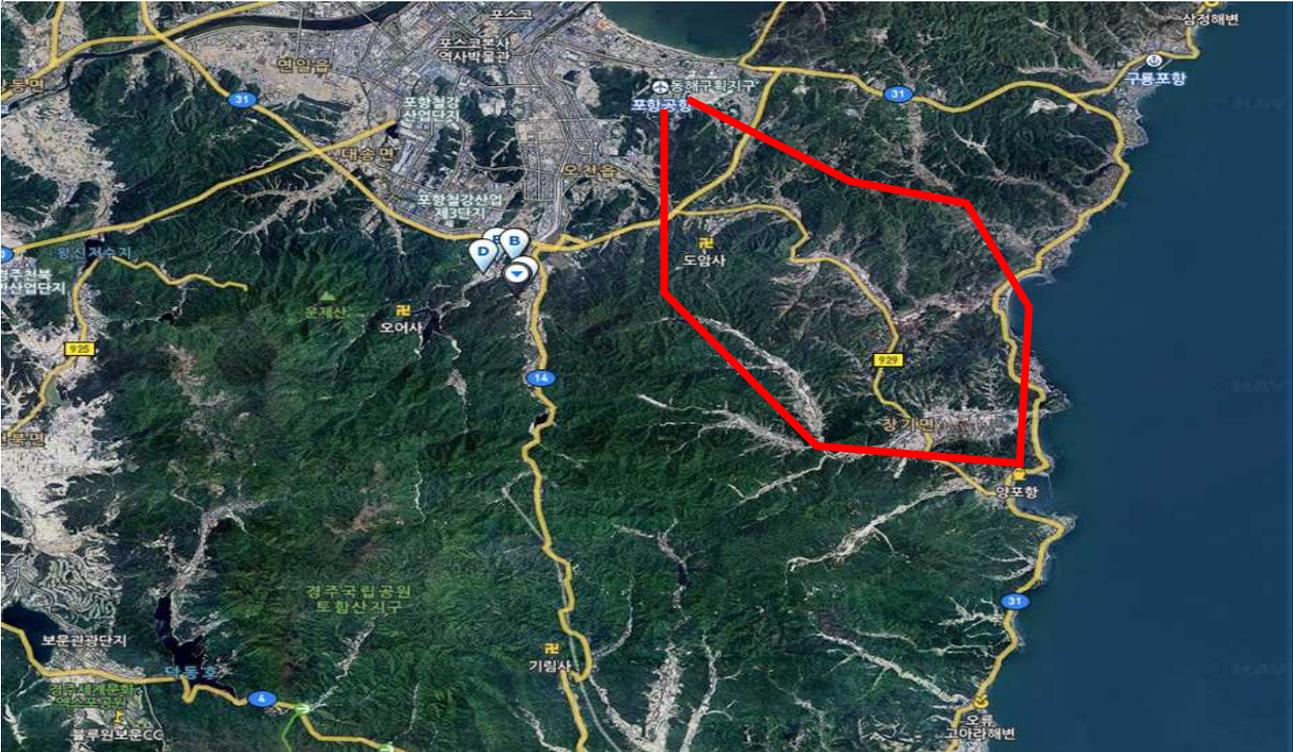
건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 50			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	신계~모포1~창지2지구 농어촌생활환경 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 신계, 모포1, 창지2리 일원		
④ 사업개요	1공구 콘크리트포장(B=2.5~3.0) L=228m, 용배수로(0.4*0.4) L=296m, 용배수로(0.5*0.5) L=70m 2공구 콘크리트포장(B=3.0) L=281m, 체육운동시설 10개 설치 3공구 아스콘트럭우기(A=2,131.7m ² , 콘크리트포장(B=2.5m) L=180m, 파향강본(D1000) L=64.4m, 파향강본(D600)		
⑤ 사업기간	2014.3.21. ~ 2014.7.18.	⑥ 시공회사 (감리회사)	전원건설 대표 허정
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공검사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 30 %, 당해연도 : 30 %		
⑧ 총 사업비 : 217.6백만원 (도급 : 87.2, 관급 : 129, 폐기물 : 1.4)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 51			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	수성~두원지구 농어촌생활환경 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 수성, 두원리 일원		
④ 사업개요	배수로(0.8*0.8) L=72m, 콘크리트포장(B=2.5~3.0) L=72m, 옹벽(H=0.6~1.64) L=133.5m 식생호안블럭쌓이기 L=127m, A=698m ²		
⑤ 사업기간	2014.3.14.~2014.7.11.	⑥ 시공회사 (감리회사)	세중건설 대표 이동문
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 30 %, 당해연도 : 30 %		
⑧ 총 사업비 : 157백만원 (도급 : 79, 관급 : 74.9, 폐기물 : 3.1)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 53			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	학곡~학계지구 농어촌생활환경 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 학곡, 학계 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.6*0.6) L=404.5m, 아스콘덧씌우기(T=5cm) A=397㎡, 콘크리트포장(B=2.5m) L=721m		
⑤ 사업기간	2014.3.19.~2014.6.16.	⑥ 시공회사 (감리회사)	성광건설 대표 김민철
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 30 %, 당해연도 : 30 %		
⑧ 총 사업비 : 155.8백만원 (도급 : 103, 관급 : 52.8)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 54			
① 관리부서	산업과 (☎270-6333)	② 사업명	창지1~서촌2지구 농어촌생활환경 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 창지1, 서촌2리 일원		
④ 사업개요	압거설치(8.0*2.2) L=8.0m, 반중력식옹벽(H=2.0~3.5) L=48.3m, 콘크리트포장(T=20cm) A=285m ² 콘크리트포장(T=20cm) L=605m, A=1,300m ²		
⑤ 사업기간	2014.3.14.~2014.7.11.	⑥ 시공회사 (감리회사)	보림건설 대표 이광진
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 손규진	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 30 %,	당해연도 : 30 %	
⑧ 총 사업비 : 152.6백만원 (도급 : 80.2, 관급 : 62.9, 폐기물 : 9.5)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 55			
① 관리부서	산업과 (☎270-6332)	② 사업명	금오~대진지구 농어촌생활환경 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 금오, 대진리 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.6*0.6) L=42.8m, 식생옹벽블록(H=0.9~2.9) L=143m, 기존식생블록보수(H=0.6) L=24.5m U형개거(0.5*0.5) L=33m, U형개거(0.6*0.7) L=101m, U형개거(1.1*1.0) L=8m, 식생옹벽블록살차(H=0.8~2.9) L=74m		
⑤ 사업기간	2014.3.14.~2014.7.11.	⑥ 시공회사 (감리회사)	유인건설 대표 전무식
감독공무원	직 : 시설6급 성명: 이상욱	준공점사공무원	직 : 성명 :
⑦ 공 정 율	전체 : 40 %,	당해연도 : 40 %	
⑧ 총 사업비 : 142.8백만원 (도급 : 79.6, 관급 : 55, 폐기물 : 8.2)			
⑨ 사업장 위치도			
