

# 건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 56			
① 관리부서	남구 자치행정과 (☎270-6024)	② 사업명	연일 증명리 농로 개설공사
③ 사업위치	포항시 남구 연일읍 증명리 1063번지일원		
④ 사업개요	수로암거(5.0*2.5) L=5.0m, 옹벽 L=11.6m, h=3.5~3.0m		
⑤ 사업기간	2014.3.12.~2014.6.9	⑥ 시공회사 (감리회사)	(주)으뜸건설 원진환
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 이한국	준공검사공무원	직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 30 %, 당해연도 : 30 %		
⑧ 총 사업비 : 36.1백만원 ( 도급 : 24.6, 관급 : 11.5 )			
⑨ 사업장 위치도			





# 건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 57			
① 관리부서	남구 자치행정과 (☎270-6024)	② 사업명	동해 약전리 농로 및 등산로 정비공사
③ 사업위치	포항시 남구 동해면 약전리 59-13번지일원		
④ 사업개요	콘크리트포장(T=0.2) B=3.0 ,L=260.0m 종배수관부설(Φ400)L=125.5m, 집수정(0.45*0.45) 7개소		
⑤ 사업기간	2014.3.12. ~ 2014.6. 9	⑥ 시공회사 (감리회사)	청산건설(주) 김도수
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 이한국	준공검사공무원	직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 70 %,		당해연도 : 70 %
⑧ 총 사업비 : 41.9백만원 ( 도급 : 22.3 관급 : 19.6 )			
⑨ 사업장 위치도			




# 건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 58			
① 관리부서	남구 자치행정과 (☎270-6024)	② 사업명	장기 금오리 마을안길(하수도) 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 금오리 533-2번지 일원		
④ 사업개요	콘크리트포장 L=83.5m, B=3.0m □형측구(500*500)L=87.5m, 집수정(0.6*0.6*0.9) 3개소		
⑤ 사업기간	2014.3.11.~2014.6.8	⑥ 시공회사 (감리회사)	(주)효경건설 유삼수
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 이한국	준공검사공무원	직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 50 %,		당해연도 : 50 %
⑧ 총 사업비 : 36.8백만원 ( 도급 : 22.2 관급 : 12.1 폐기물 2.5 )			
⑨ 사업장 위치도			

# 건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 59			
① 관리부서	남구 자치행정과 (☎270-6024)	② 사업명	구룡포 석병2리 농로 확포장공사
③ 사업위치	포항시 남구 구룡포읍 석병리 1111-17번지일원		
④ 사업개요	콘크리트포장(T=20.0cm) B=6.0m , L=120.0m U형개거설치(0.4X0.5) L=120.0m, 배수관설치(D150mm) L=47.7m		
⑤ 사업기간	2014.3.5. ~ 2014.5.3	⑥ 시공회사 (감리회사)	경토건설(주) 이동대
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 이한국	준공검사공무원	직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 40 %      당해연도 : 40 %		
⑧ 총 사업비 : 70.8백만원 ( 도급 : 38.6, 관급 : 20.7 폐기물 11.5 )			
⑨ 사업장 위치도			

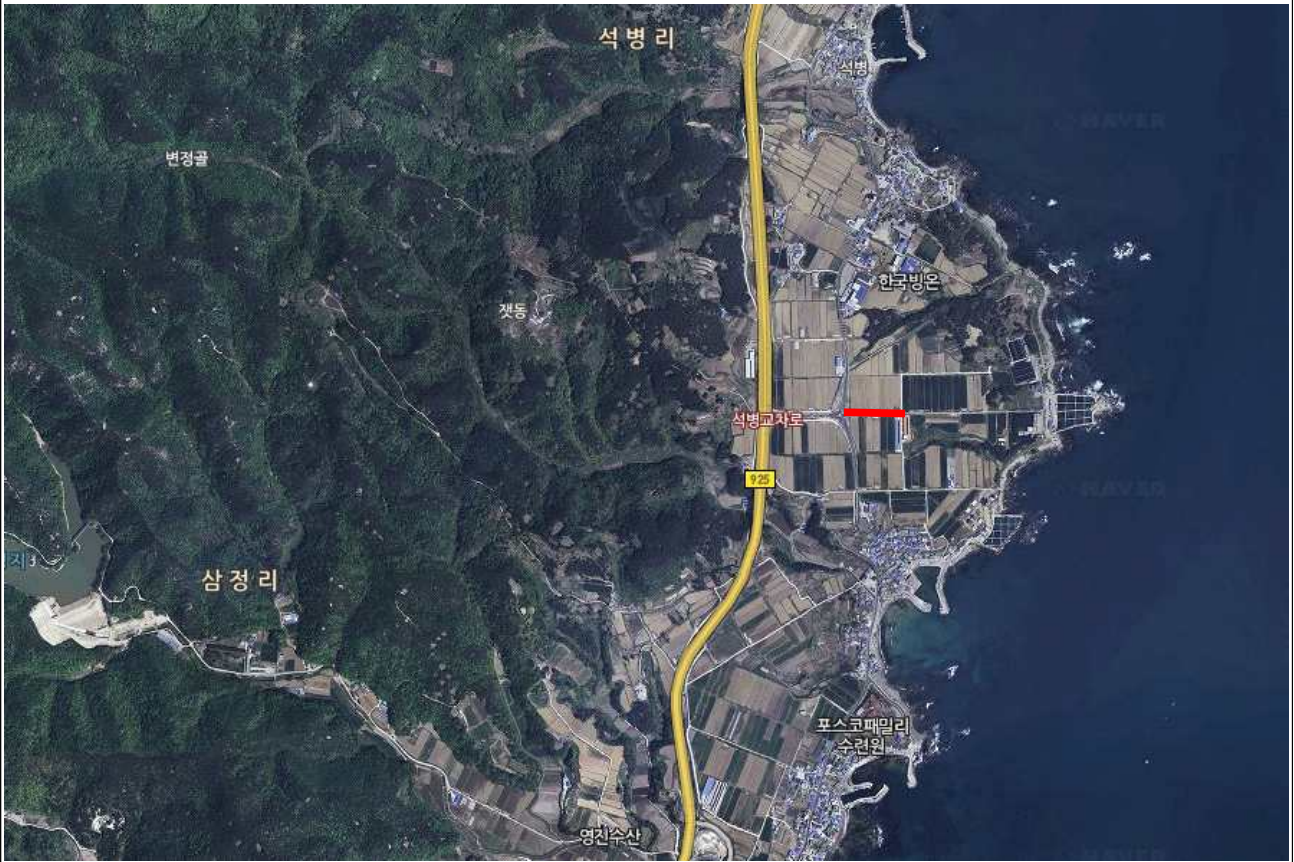



# 건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 60			
① 관리부서	남구 자치행정과 (☎270-6024)	② 사업명	장기 임중1리 세천 복개공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 임중리 639-15번지 일원		
④ 사업개요	암거 (1.0*1.0) L=62.0m 콘크리트포장(T=0.2) L=61.0m B=2.4m A=149.0㎡		
⑤ 사업기간	2014.3.13 ~ 2014.6.10	⑥ 시공회사 (감리회사)	유인건설(주) 전무식
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 이한국	준공검사공무원	직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 40 % ,		당해연도 : 40 %
⑧ 총 사업비 : 55.4백만원 ( 도급 : 32.6, 관급 : 18.3 폐기물 4.5 )			
⑨ 사업장 위치도			



# 건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 61			
① 관리부서	남구 자치행정과 (☎270-6024)	② 사업명	대송 송동2리 용배수로 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 대송면 송동리 528번지 일원		
④ 사업개요	U형개거(0.5*0.5) L=280.0m		
⑤ 사업기간	2014.3.7~ 2014.5.5	⑥ 시공회사 (감리회사)	에스에이치개발(주) 임재은
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 이한국	준공검사공무원	직 : 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 70 %, 당해연도 : 70 %		
⑧ 총 사업비 : 49.2백만원 ( 도급 : 35.7, 관급 : 13.5 )			
⑨ 사업장 위치도			

