

건설공사 관리카드

등록번호 : 2013 - 151			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	홍해읍(마산사거리~홍해읍사무소)배수관이설공사
③ 사업위치	포항시 북구 홍해읍(마산사거리) 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D250mm) L=358m		
⑤ 사업기간	2013.12.16.~2014.5.21.	⑥ 시공회사 (감리회사)	(주)삼양개발
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10 %, 당해연도 : 10 %		
⑧ 총 사업비 : 80백만원 (도급 : 42, 관급 : 36, 폐기물 : 2)			
⑨ 사업장 위치도			



건설공사 관리카드

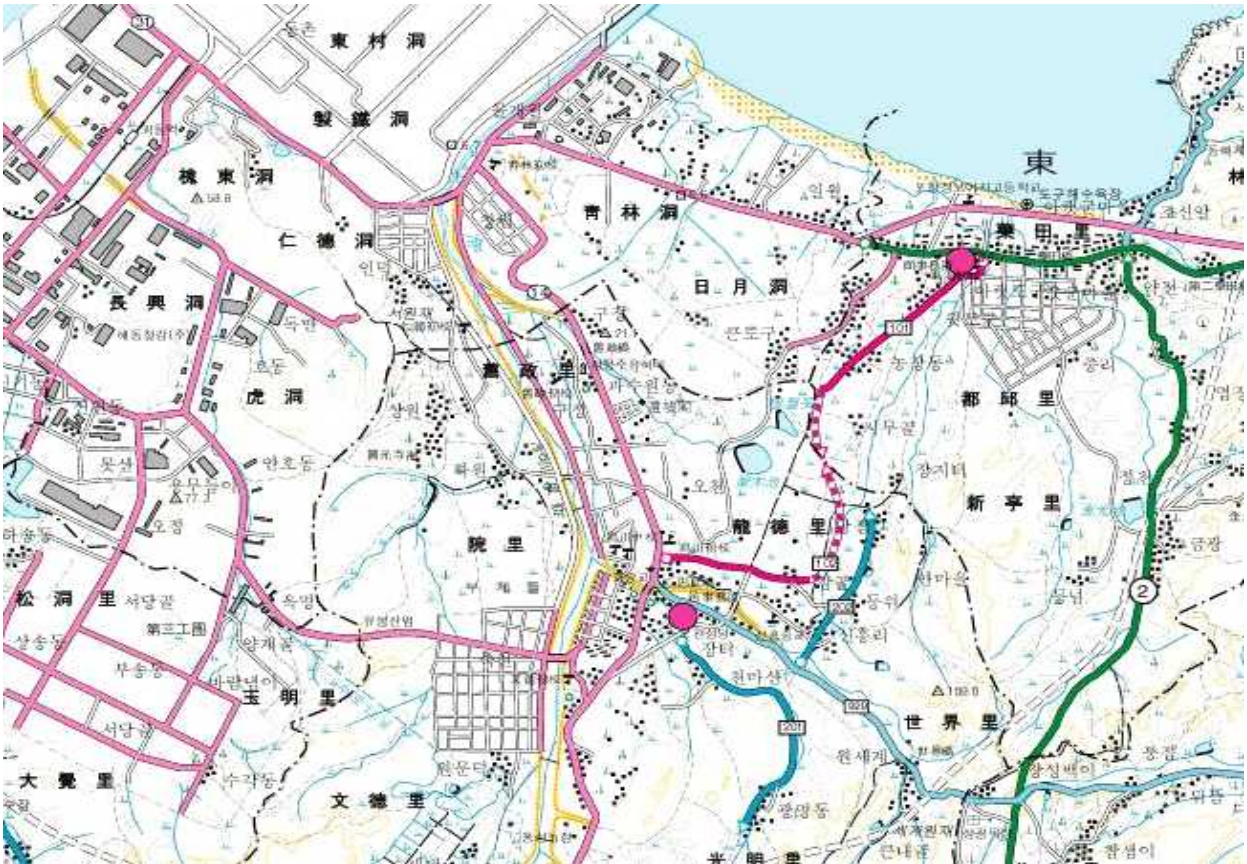
등록번호 : 2014 - 152			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	홍해읍 덕성리 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 북구 홍해읍 덕성리 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D100~150mm) L=2,0km		
⑤ 사업기간	2014.3.28.~2014.7.25.	⑥ 시공회사 (감리회사)	(합)두산건설
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 15 %, 당해연도 : 15 %		
⑧ 총 사업비 : 269백만원 (도급 : 133, 관급 : 124, 폐기물 : 12)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 153			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	홍해읍 용전리 배수관 부설공사
③ 사업위치	포항시 북구 홍해읍 용전리 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D150mm) L=2,2km		
⑤ 사업기간	2014.3.31.~2014.7.28.	⑥ 시공회사 (감리회사)	한라오엠에스(주)
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 15 %,		당해연도 : 15 %
⑧ 총 사업비 : 253백만원 (도급 : 117, 관급 : 130, 폐기물 : 6)			
⑨ 사업장 위치도			



건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 154			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	오천읍 원리(하원) 배수관 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 오천읍 원리 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D100~25mm) L=1.4km		
⑤ 사업기간	2014.3.17.~2014.6.14.	⑥ 시공회사 (감리회사)	(자)문화수도공업사
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 20 %, 당해연도 : 20 %		
⑧ 총 사업비 : 89백만원 (도급 : 56, 관급 : 24, 폐기물 : 9)			
⑨ 사업장 위치도			
			

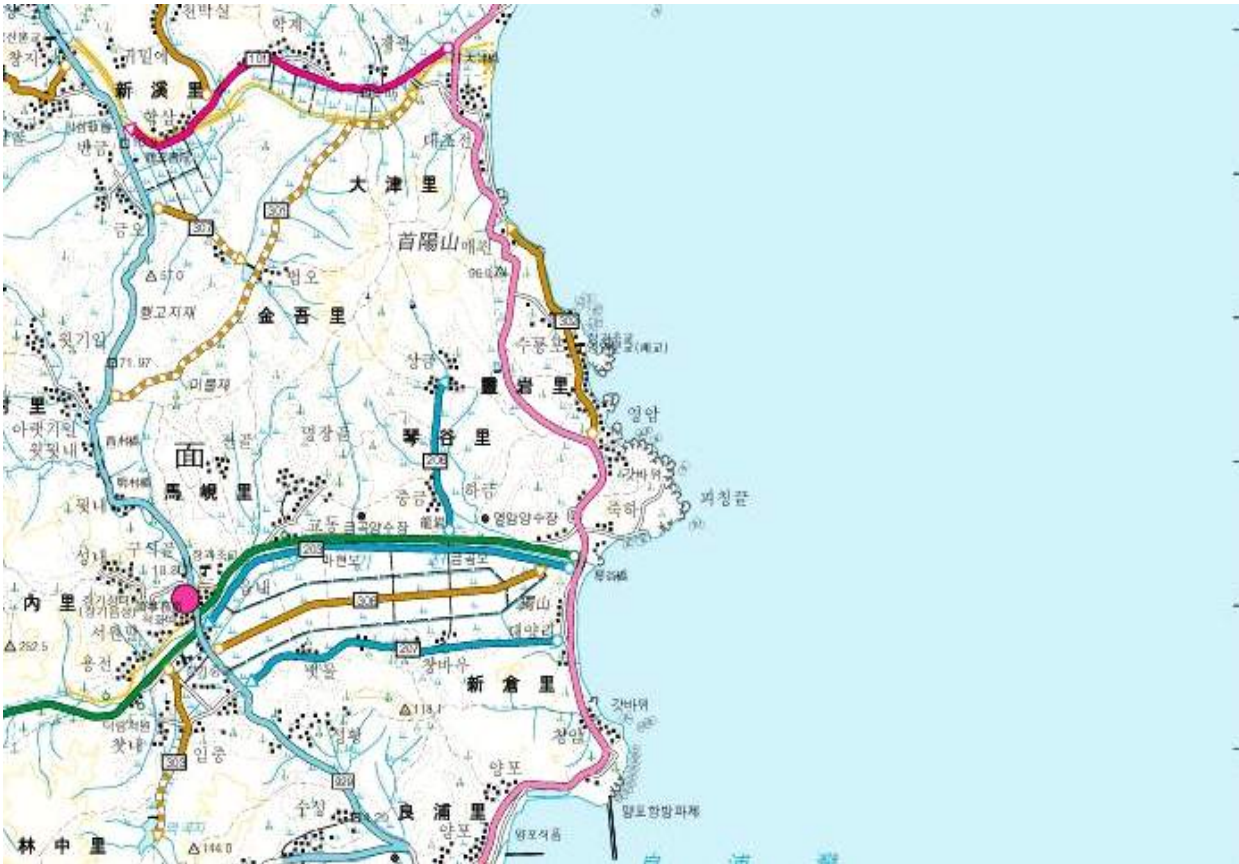
건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 155			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	구룡포 하정2리 지방상수도 인입공사
③ 사업위치	포항시 남구 구룡포읍 하정2리 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D100~25mm) L=1.7km		
⑤ 사업기간	2014.3.28.~2014.7.25.	⑥ 시공회사 (감리회사)	동영개발(주)
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10 %, 당해연도 : 10 %		
⑧ 총 사업비 : 220백만원 (도급 : 121, 관급 : 75, 폐기물 : 24)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 156			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	장기면 영암1~2리 지방상수도 인입공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 영암1~2리 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D100~25mm) L=0.9km		
⑤ 사업기간	2014.3.25.~2014.7.22.	⑥ 시공회사 (감리회사)	혜성기업(주)
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10 %, 당해연도 : 10 %		
⑧ 총 사업비 : 143백만원 (도급 : 85, 관급 : 43, 폐기물 : 15)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 158			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	장기면 대진리 지방상수도 인입공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 대진리 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D100~25mm) L=1.3km		
⑤ 사업기간	2014.3.25.~2014.7.22.	⑥ 시공회사 (감리회사)	재헌건설(주)
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10 %,		당해연도 : 10 %
⑧ 총 사업비 : 136백만원 (도급 : 82, 관급 : 38, 폐기물 : 16)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 159			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	홍해읍 덕성1~2리 지방상수도 인입공사
③ 사업위치	포항시 북구 홍해읍 덕성1~2리 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D100~25mm) L=1.3km		
⑤ 사업기간	2014.3.25.~2014.7.22.	⑥ 시공회사 (감리회사)	장성건설(주)
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 15 %, 당해연도 : 15 %		
⑧ 총 사업비 : 131백만원 (도급 : 74, 관급 : 51, 폐기물 : 6)			
⑨ 사업장 위치도			



건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 160			
① 관리부서	상수도과 (☎270-5365)	② 사업명	송라면(광천리~조사리) 배수관 보강공사
③ 사업위치	포항시 북구 송라면 광천리~조사리 일원		
④ 사업개요	배수관로 부설(D250mm) L=2.2km		
⑤ 사업기간	2014.3.28.~2014.7.25.	⑥ 시공회사 (감리회사)	유성환경산업(주)
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 이상훈	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10 %,		당해연도 : 10 %
⑧ 총 사업비 : 402백만원 (도급 : 161, 관급 : 219, 폐기물 : 22)			
⑨ 사업장 위치도			
			
